

1ª ETAPA  
Gener 2024:

1ª ETAPA  
Febrer a Juny 2024:


2ª ETAPA  
Juliol 2024 a Gener 2025:

3ª ETAPA  
Febrer a Juny 2025:


PLANTA SOTERRANI



No es fa cap actuació en planta

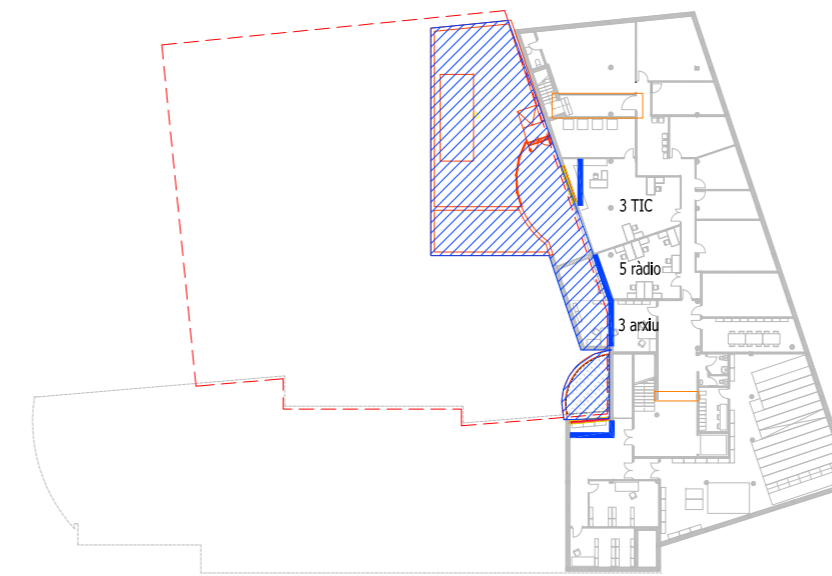


Trasllat del personal de planta a planta primera on ja s'hauran realitzat les actuacions de rehabilitació interior  
Actuacions de repicat de murs i terreny.  
Fonamentació  
Execució de forjats  
Actuacions en l'interior de l'edifici existent per la compliment de la sectorització

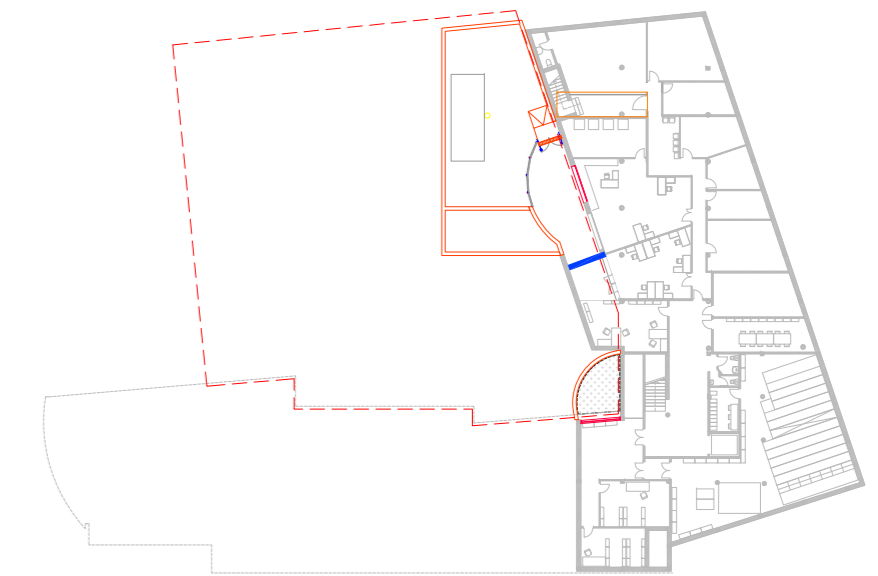


Trasllat del personal de planta a planta primera on ja s'hauran realitzat les actuacions de rehabilitació interior  
Actuacions de repicat de murs i terreny.  
Fonamentació  
Execució de forjats  
Actuacions en l'interior de l'edifici existent per la compliment de la sectorització


PLANTA BAIXA

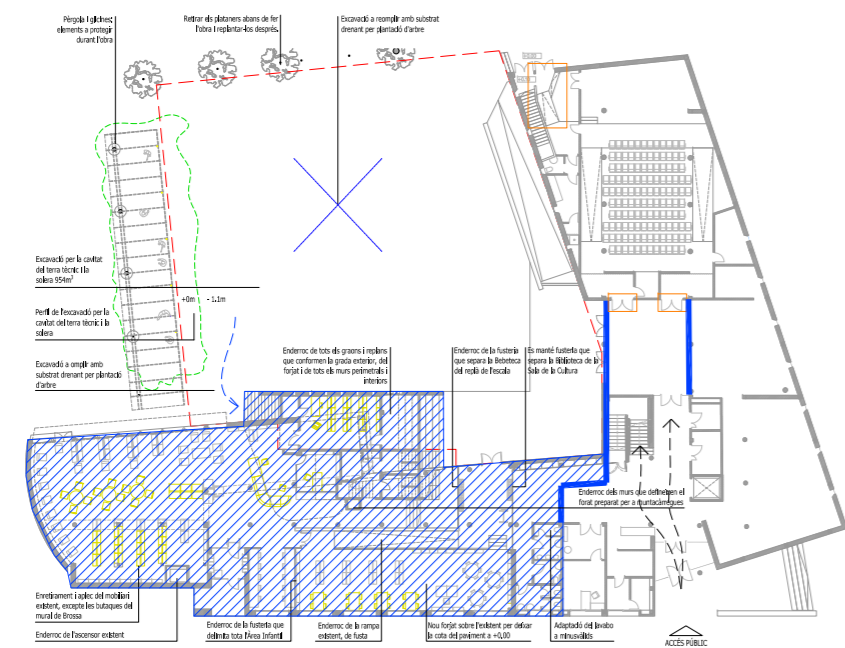


Trasllat Biblioteca i llibres  
Implantació de l'obra  
Actuació en la rehabilitació interior edifici existent  
Execució del lavabo de minusvàlids d'un mes

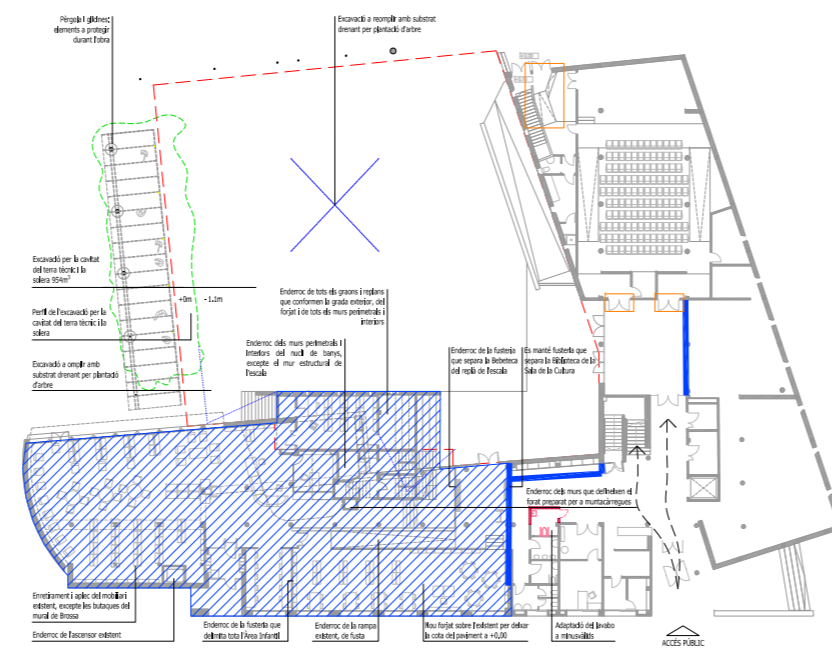


Obertura les lavabo de minusvàlids  
accés als lavabos

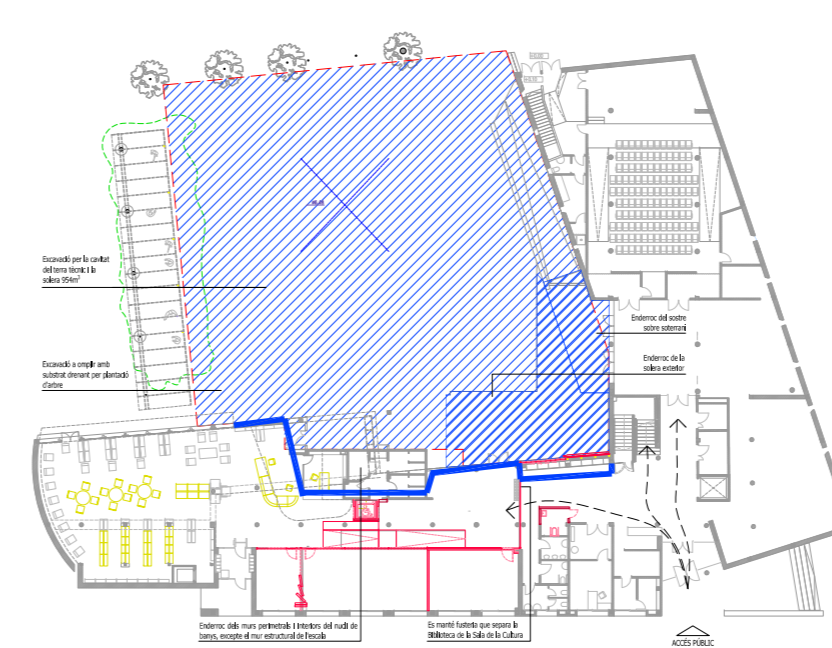


Obertura de la biblioteca

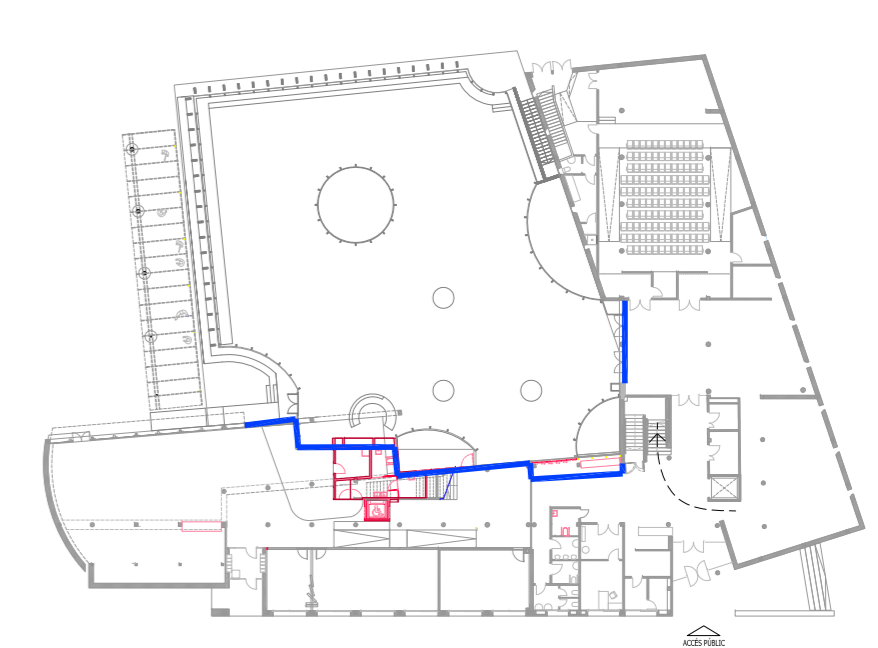


PLANTA PRIMERA

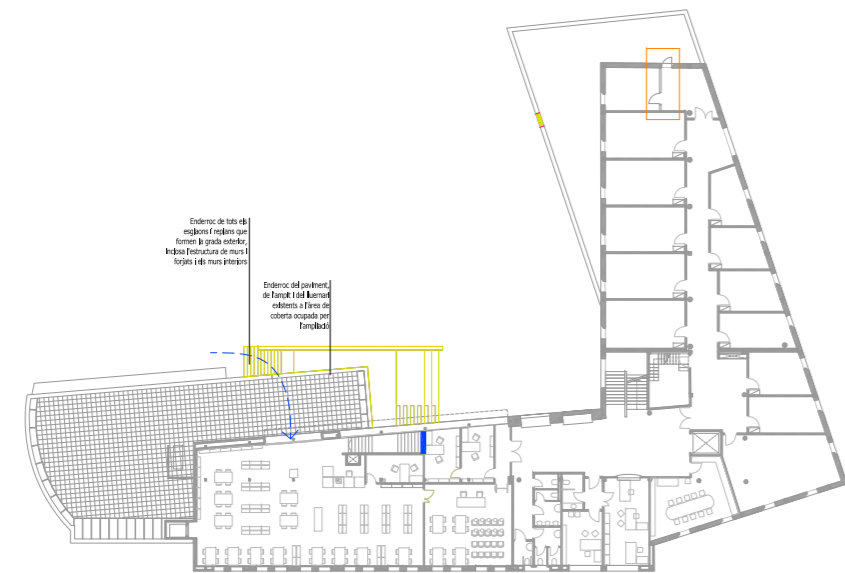


Trasllat personal Cultura  
Trasllat Biblioteca i llibres  
Actuació en la rehabilitació interior edifici existent  
Enderroc volum exterior  
Rehabilitació de rases fonamentació nova

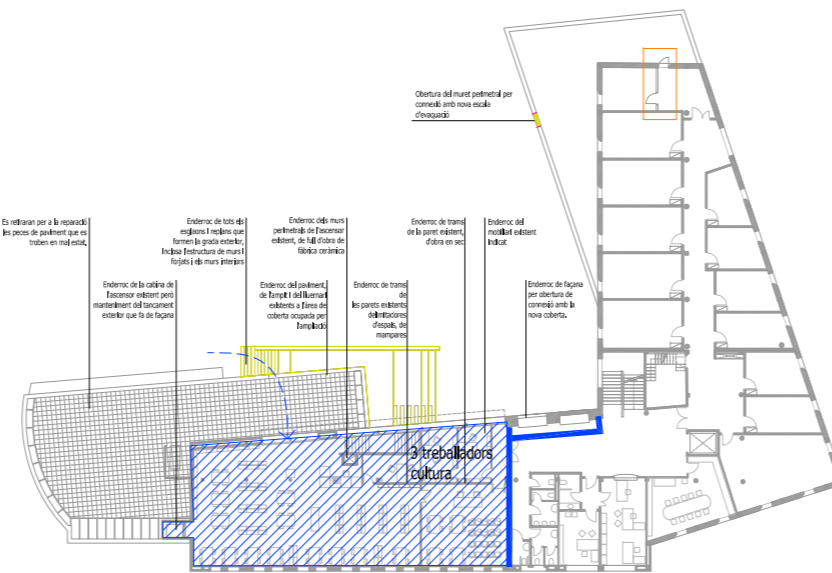

Trasllat personal Cultura  
Trasllat Biblioteca i llibres  
Actuació en la rehabilitació interior edifici existent  
Enderroc volum exterior  
Rehabilitació de rases fonamentació nova

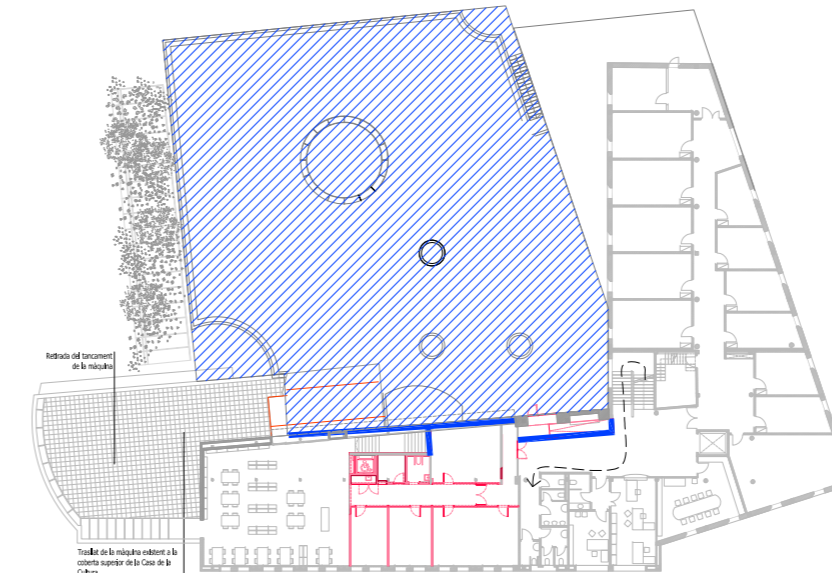

Reubicació del personal de Planta Soterrani a aquesta planta. TIC, ràdio i arxíu.

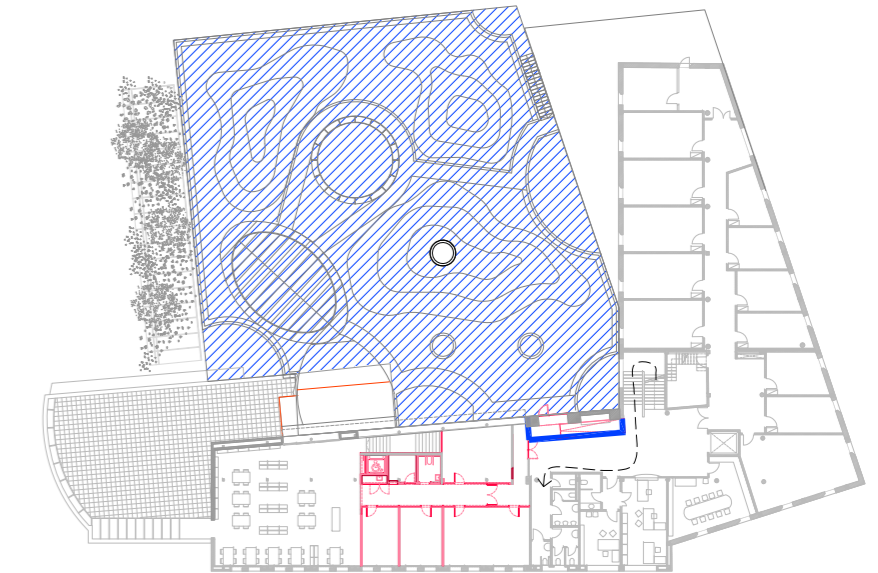

Reubicació del personal de Planta Soterrani a aquesta planta. TIC, ràdio i arxíu.  
Obertura de nou al públic de la Biblioteca  
Connexió entre els dos edificis en fase final
